Управление

- Разработка стратегии освоения как отдельных объектов недропользования, так и всего портфеля объектов компании недропользователя;
- Подготовка технико-экономических расчетов (ТЭР), предварительных технико-экономических обоснований целесообразности инвестиций (ПредТЭО), технико-экономических обоснований инвестиционных проектов (ТЭО), Бизнес-планов освоения объектов недропользования, банковских ТЭО;
- Разработка рекомендаций в сфере организации корпоративного управления компании-недропользователя;
- Финансовый, юридический и экономический аудит компании – недропользователя.

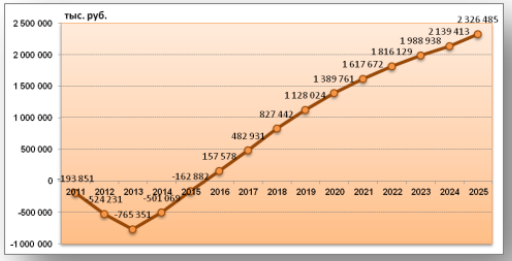

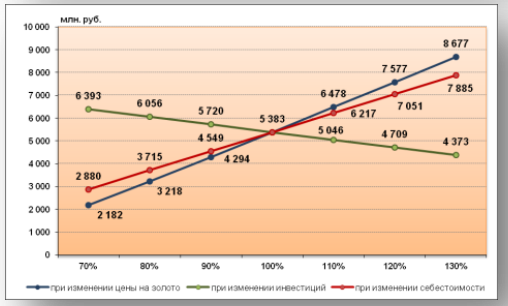

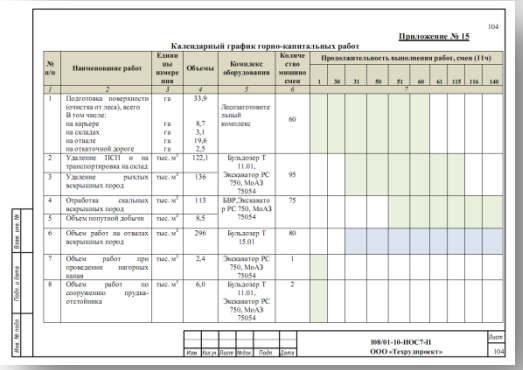
Приложение № 15

Календарный график горно-капитальных работ

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Объемы	Комплекс оборудования	Количество машино смен	Продолжительность выполнения работ, смен (11ч)
1	Подготовка поверхности (очистка от леса), всего В том числе: на карьере на складах на отвале на отработкой дороге	га га га га га	33,9 8,7 3,1 19,6 2,5	Лесозаготовительный комплекс	60	
2	Удаление ПСП и на транспортировка на склад	тыс. м³	122,1	Бульдозер Т 11.01,		
3	Удаление рыхлых вскрышных пород	тыс. м³	136	Экскаватор РС 750, МоАЗ 75054	95	
4	Отработка скальных вскрышных пород	тыс. м³	113	БВР,Экскаватор РС 750, МоАЗ 75054	75	
5	Объем попутной добычи	тыс. м³	8,5			
6	Объем работ на отвалах вскрышных пород	тыс. м³	296	Бульдозер Т 15.01	80	
7	Объем работ при проведении нагорных канав	тыс. м³	2,4	Экскаватор РС 750, МоАЗ 75054	1	
8	Объем работ по сооружению пруда-отстойника	тыс. м³	6,0	Бульдозер Т 11.01, Экскаватор РС 750, МоАЗ 75054	2	

108/01-10-НОСТ-П
ООО «Техуглепроект»
